


# บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านเจ๊กแป๊ะ



งบประมาณ 1,550,000 บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568)  
ตรวจรับงานงวดสุดท้ายและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว  
ต่อน้ำต่อไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้เข้าพักอาศัยได้

# บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.เกาะหมาก

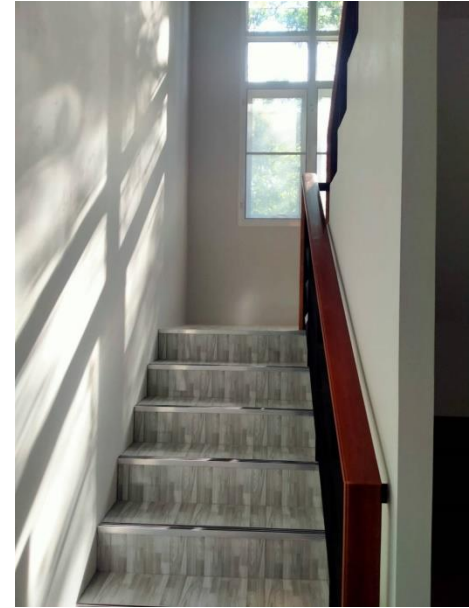

- งบประมาณ 1,777,000 บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568)
- ล่าช้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ และปัญหา Cash Flow ของทางบริษัท (ได้รับการแก้ไขแล้ว)
- ส่งมอบงานงวด 4-5 แล้ว ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568
- เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

# บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านคลองแ่อง



- งบประมาณ 1,220,000 บาท (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 29 ธันวาคม 2567)
- ผู้รับเหมาปฏิบัติงานล่าช้า สสจ.ทำหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว
- กรรมการตรวจรับและเบิกจ่ายงานงวด 3 แล้ว
- ผู้รับเหมาส่งมอบงานงวด 4-5 แล้ว ตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568
- อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย

# โรงจอดรถ 20 คัน รพ.บ่อไร่



งบประมาณ 2,996,000 บาท (3 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 18 ธันวาคม 2567)

- ผู้รับเหมาส่งงานงวด 2-3 งวดสุดท้าย พร้อมกัน
- ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

# อาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน รพ.สต.บ้านสลักเพชร



- งบประมาณ 2,159,999 บาท (4 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568)
- ล่าช้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ และปัญหา Cash Flow ของทางบริษัท (ได้รับการแก้ไขแล้ว)
- ตรวจรับงานงวด 3 แล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย
- ระบบสุขาภิบาลทำเสร็จแล้ว งานหินขัดทรายล้างและวางระบายน้ำเสร็จแล้ว  
เหลืองานติดตั้งสุขภัณฑ์ผู้พิการ กระจกอลูมิเนียม ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ เก็บงานสีงานไฟฟ้า
- คณะกรรมการตรวจรับ สั่งการให้ดำเนินการแล้วเสร็จส่งงานงวดสุดท้ายโดยเร็ว
- ผู้รับเหมาแจ้งว่าจะส่งงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ 10 มิถุนายนนี้

# ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (สสจ.ตราด)

รายการ		หน่วยงาน	ราคา	ความก้าวหน้า
<b>รายการสิ่งก่อสร้าง</b>				
1	ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.แหลมงอบ	13,400,000	E-bidding แล้ว พวจ.ลงนามประกาศผู้ชนะแล้วเมื่อ 26 พ.ค.68 จะเร่งรัดเพื่อเรียกทำสัญญาต่อไป
2	ปรับปรุงอาคาร	สสอ.เกาะช้าง	134,400	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	ปรับปรุงอาคาร	สสอ.เกาะกูด	200,000	ตรวจรับและเบิกจ่ายในระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 27 มีนาคม 2568

รายการ		หน่วยงาน	ราคา	ความก้าวหน้า
<b>รายการครุภัณฑ์</b>				
1	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ ช่วยชีวิตขั้นสูง	รพ.คลองใหญ่	2,500,000	ส่งมอบ ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย ไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	รพ.เขาสมิง	250,000	ส่งมอบ ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

## ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (รพ.ตราด)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	ความก้าวหน้า
1	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ชนิดความถี่สูงแบบขับเคลื่อน	2,000,000	เบิกจ่ายแล้ว
2	กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรม พร้อมชุดถ่ายภาพ	2,000,000	เบิกจ่ายแล้ว
3	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวี ดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิติ	2,500,000	เบิกจ่ายแล้ว
4	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย อัตโนมัติ	1,000,000	เบิกจ่ายแล้ว
5	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ	2,500,000	เบิกจ่ายแล้ว

## ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (รพ.ตราด)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	ความก้าวหน้า
6	ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ พร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวิดีโอ	3,000,000	เบิกจ่ายแล้ว
7	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน	1,700,000	เบิกจ่ายแล้ว
8	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	2,000,000	เบิกจ่ายแล้ว
9	อาคารเภสัชกรรม เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร	7,530,400	ประกาศแล้วไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างเสนอยกเลิกประกาศ และขอทบทวนราคากลาง

# ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม

## ปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายเงินแล้ว	คิดเป็นร้อยละ
รพ.เขาสมิง	37	-	37	100
รพ.เกาะช้าง	14	-	14	100
รพ.บ่อไร่	33	2	31	93.94
รพ.แหลมงอบ	20	2	18	90.00
รพ.คลองใหญ่	9	1	8	89.89
รพ.เกาะกูด	3	-	3	100
รพ.ตราด	56	3	53	96.64
<b>รวม</b>	<b>172</b>	<b>8</b>	<b>164</b>	<b>95.35</b>

หมายเหตุ : งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 172 รายการ วงเงิน 21,015,211.08 บาท

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 95.35 เป็นลำดับ 3 ของเขต

# รายการงบประมาณ ปี 2567 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

- เครื่องปรับอากาศ รพ.สต.หนองเสม็ด
- รถกระบะ รพ.สต.บ้านท้ายวัง
- รถกระบะ รพ.สต.บ้านหาดเล็ก
- ยูนิตทำฟัน รพ.สต.น้ำเขียว
- ยูนิตทำฟัน รพ.แหลมงอบ
- ยูนิตทำฟัน รพ.ตราด
- รถพยาบาล รพ.ป่อไร่

# ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม

## ปีงบประมาณ 2568

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายเงินแล้ว	คิดเป็นร้อยละ
รพ.เขาสมิง	20	20		
รพ.เกาะช้าง	10	10		
รพ.บ่อไร่	22	22		
รพ.แหลมงอบ	22	22		
รพ.คลองใหญ่	11	11		
รพ.เกาะกูด	2	2		
รพ.ตราด	58	58		
<b>รวม</b>	<b>145</b>	<b>145</b>		

หมายเหตุ : งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 145 รายการ วงเงิน 26,484,700.38 บาท

# ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568

- ให้รพ.เร่งโอนเงินให้ รพ.สต. เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามแผน
- รายการครุภัณฑ์ที่วงเงิน < 500,000 บาท  
เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน (31 ส.ค.68)
- รายการครุภัณฑ์ที่วงเงิน > 500,000 บาท  
เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน (31 ธ.ค.68)
- รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้เร่งรัดดำเนินการตามแผน
- ให้รพ.ทุกแห่ง รายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามงบประมาณแบบเชื่อมโยงเว็บ สปสช.  
เพื่ออัปเดตความก้าวหน้าให้ ผู้บริหารและสปสช.ทราบสม่ำเสมอ
- กลุ่มงานบริหาร สสจ.จะติดตามความก้าวหน้ารายงานในที่ประชุม คปสจ.  
ทุกเดือน
